


设备试运行记录

项目名称：泰顺县公共卫生临床中心气动物流传输系统
项目编号：TSCG202302009

建设单位	泰顺县人民医院 (泰顺县人民医院医共体)	
施工单位	温州恩启贸易有限公司	
设备（系统）名称	运行情况	备注
气动物流传输系统	1. 所有管路用清洁瓶清洁一次，所有管路正常；	
	2. 气动风机启停运行正常；	
	3. 风机风向切换器切换正常；	
	4. 每个站点传输瓶发送和接收正常（共9个站点）；	
	5. 三向转换器工作正常（共2个三向转换器）	
	6. 系统监控系统运转正常；	

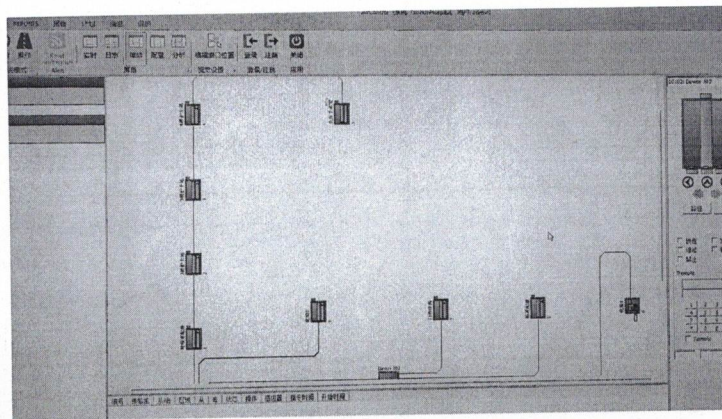

系统整体工作状态：设备整体运行良好，可以进行验收移交。

泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）
智能气动物流传输系统
项目专用章
温州恩启贸易有限公司
施工单位（签名）：杨体元
日期：2025年3月31日

泰顺县人民医院
建设单位（签名）：[Signature]
日期：2025年3月31日

注：运行情况栏中，注明正常/不正常；不正常的在备注栏内扼要说明情况（包括修复日期）。

第三章 调试记录表

一、站点调试记录表

站点 编号	电机动作			站点屏幕		光电感应	内部接线		管道接口
	1号位	2号位	3号位	显示是 否正常	按键是 否正常	感应是否 正常	电源接 线是否 正常	通讯接 线是否 正常	接口是否 紧密
1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
2	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
3	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
4	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
6	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
7	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
8	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常
9	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常

二、三向转换器调试记录表

转向器编号	转向器校位			光电开关感应是否正常	管道接口是否紧密	备注
	位置1	位置2	位置3			
101	OK	OK	OK	正常	正常	
102	OK	OK	OK	正常	正常	

三、风向切换器调试记录表

风向切换器编号	转向器校位			消音器是否正常	管道接口是否紧密	备注
	位置1	位置2	位置3			
101	OK	OK	OK	正常	正常	

泰顺县公共卫生临床中心气动物流传输系统已完成调试，系统可进入试运行、验收移交。

调试工程师: 徐路

项目技术负责人: 谢红升

项目负责人: 内继亮

泰顺县人民医院 (泰顺县人民医院医共体)

智能气动物流传输系统

项目专用章

温州恩启贸易有限公司

日期: 2021.2.28

日期: 2025.2.28

日期: 2025.2.28

